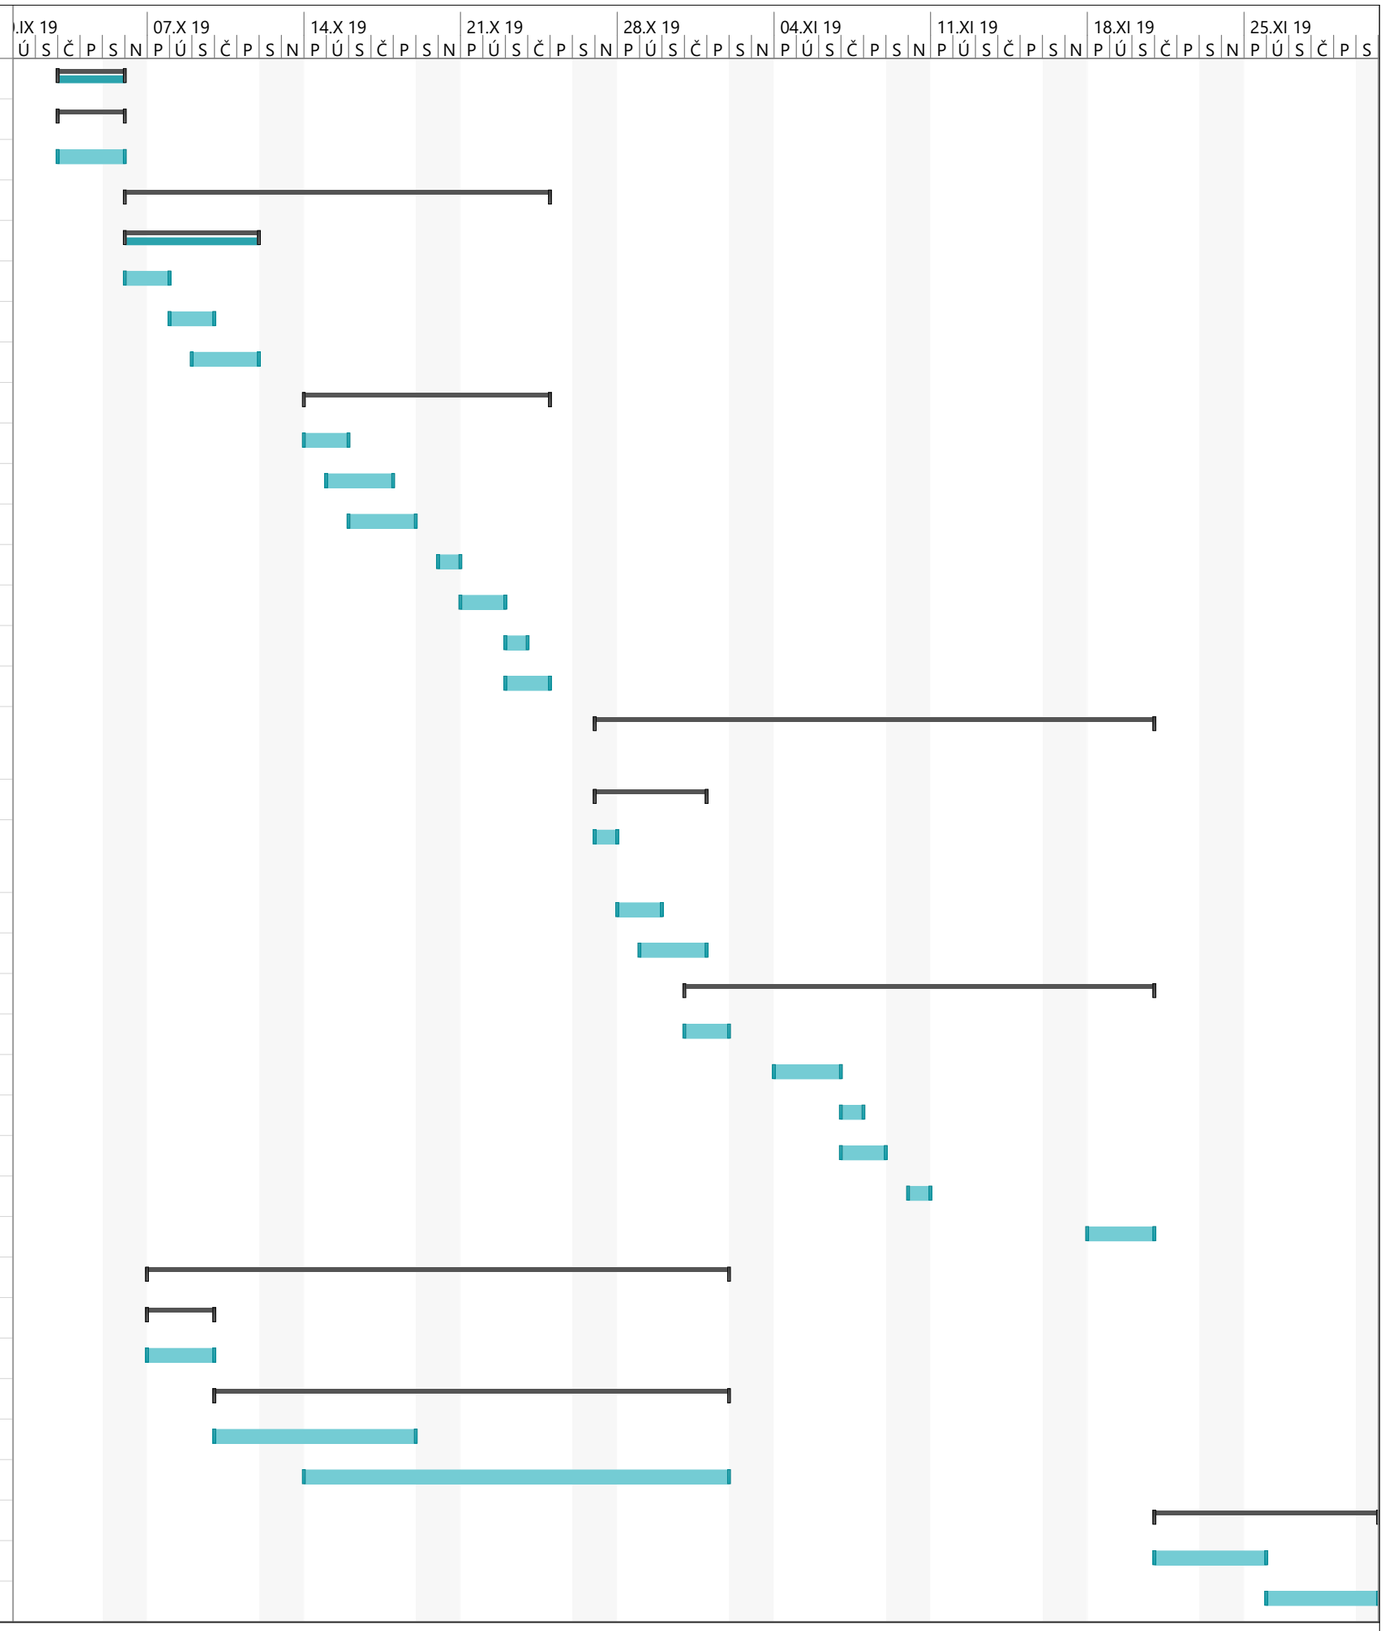ID		Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení
1			**Oprava MK ulice Pražská**	**03.10. 19**
2			**Předání a převzetí staveniště**	**03.10. 19**
3			Vytýčení sítí	03.10. 19
4			**I. úsek úplná uzavírka /od OK k kř. MK ulice Dukelská/**	**06.10. 19**
5			**Přípravné a bourací práce**	**06.10. 19**
6			Instalace DIO - úplná uzavírka /od OK k ulici Dukelská/	06.10. 19
7			Frézování a reprofilace do hl.100mm	08.10. 19
8			Dobourání u obrub, napojení, šachet a vpustí	09.10. 19
9			**Stavební práce**	**14.10. 19**
10			Lokální sanace nad sítěmi KSC	14.10. 19
11			Výšková úprava šachet, vpustí a šoupat	15.10. 19
12			Lokální vyrovnání obrubníků	16.10. 19
13			Infiltrační nátěr	20.10. 19
14			Pokládka ložné vrstvy z ACL16 tl.60mm	21.10. 19
15			Spojovací nátěr	23.10. 19
16			Pokládka obrusné vrstvy ACO11 40mm	23.10. 19
17			**II. úsek úplná uzavírka /od kř. MK ulice Dukelská na kř.Mendelova/**	**27.10. 19**
18			**Přípravné a bourací práce**	**27.10. 19**
19			Instalace DIO - úplná uzavírka /od ulice Dukelská - ulice Mendelova/	27.10. 19
20			Frézování a reprofilace do hl.100mm	28.10. 19
21			Dobourání u obrub, napojen, šachet a vpustí	29.10. 19
22			**Stavební práce**	**31.10. 19**
23			Lokální sanace nad sítěmi KSC	31.10. 19
24			Výšková úprava šachet, vpustí a šoupat	04.11. 19
25			Infiltrační nátěr	07.11. 19
26			Pokládka ložné vrstvy z ACL16 tl. 60mm	07.11. 19
27			Spojovací nátěr	10.11. 19
28			Pokládka obrusné vrstvy ACO11 40mm	18.11. 19
29			**Částečná uzavírka MK /od.kř. MK Dukelská na kř. Mendelova/**	**07.10. 19**
30			**Přípravné a bourací práce**	**07.10. 19**
31			Bourání chodníků a vytrhání obrub - vlevo	07.10. 19
32			**Stavební práce**	**10.10. 19**
33			Osazení a vyrovnání obrubníků	10.10. 19
34			Dlažba chodníků	14.10. 19
35			**Dokončovací práce**	**21.11. 19**
36			VDZ barvou	21.11. 19
37			Předání a převzetí stavby	26.11. 19
